

Azure DevOps

Planejamento e gestão de projetos na prática

MBA em Gerenciamento de Projetos · 29/09/2026

Arimatéia Júnior

Formação

- Pós-graduado em Engenharia de Software com ênfase em DevOps – UNIFOR (2025)
- MBA em Arquitetura de Software e Soluções – XP Educação (2023)
- Especialização em Segurança da Informação – UNINASSAU (2021)
- Redes de Computadores – Faculdade Lourenço Filho (2014)

Experiência profissional

- Arquiteto de Software e Soluções – TIVIT (cliente: Petrobras)
- Consultor de Tecnologia – ARI JR Technology



Apaixonado por família, tecnologia e futebol

Certificado em diversas tecnologias





O que vamos fazer hoje

4 horas · teoria curta, prática longa · 29/09/2026



45 min

Teoria + demo

DevOps, Azure DevOps,
processos e demonstração



15 min

Acesso

Login, projeto da equipe e
primeira pipeline



2h40

Prática

Backlog, sprint, pipeline e
dashboard



20 min

Apresentações

4 min por equipe

Objetivo: sair daqui sabendo transformar um objetivo de negócio em um plano rastreável, com escopo, prioridade, Sprint e acompanhamento.



Desafios da gestão tradicional de projetos

Onde os projetos costumam perder o controle



Pouca visibilidade

sobre o andamento real do projeto



Comunicação dispersa

e-mail, planilhas, conversas soltas



Retrabalho

e perda de informações e decisões



Entregas difíceis de acompanhar

quem faz o quê, e até quando?



Sem rastreabilidade

nem histórico das mudanças



Indicadores inconsistentes

para a tomada de decisão

Ferramentas modernas surgiram justamente para atacar esses problemas e para integrar as áreas técnicas e de negócio.



O que é DevOps?

DevOps é mais do que uma ferramenta ou metodologia: é uma cultura que une Desenvolvimento (Dev) e Operações (Ops) para entregar valor de forma rápida, contínua e com qualidade, com o mínimo de atrito entre as equipes.

DevOps não é apenas tecnologia.

É colaboração, automação, visibilidade e melhoria contínua.

Principais benefícios



Integra times técnicos e não técnicos



Automatiza do planejamento à entrega



Reduz o tempo de entrega, com qualidade



Mais visibilidade e rastreabilidade



Processos em um único ecossistema



Azure DevOps: uma plataforma, cinco serviços

Do planejamento à entrega, tudo integrado e rastreável



Azure Boards

Planejamento:
backlog, Kanban,
sprints



Azure Repos

Versionamento de
código (Git)



Azure Pipelines

Automação:
integração e entrega
contínua (CI/CD)



Azure Test Plans

Testes manuais e
automatizados



Azure Artifacts

Pacotes (npm,
NuGet, etc.)

FOCO DE HOJE

Os demais serviços aparecem só na demonstração: a gestão acontece no Boards.



Azure Boards: o que vamos usar hoje



Backlog

Lista priorizada de tudo o que o projeto precisa entregar.



Board (Kanban)

Quadro visual: A fazer → Fazendo → Feito.



Sprints

Ciclos curtos (ex.: 2 semanas) com meta e capacidade.



Consultas (Queries)

Filtros salvos: riscos abertos, itens atrasados...



Dashboards

Painel com progresso, burndown e indicadores.



Glossário rápido


O vocabulário do Azure Boards traduzido para gestão de projetos

Termo	Significado	Exemplo
Epic	Grande objetivo ou iniciativa	<i>Lançar o app de delivery</i>
Feature	Entrega relevante que compõe o Epic	<i>Programa de parceiros</i>
User Story / PBI	Necessidade de um usuário, com valor	<i>Como cliente, quero acompanhar meu pedido</i>
Task	Atividade concreta, com responsável e horas	<i>Treinar equipe da loja 1 (4h)</i>
Backlog	Lista priorizada de itens	<i>Ordem = prioridade</i>
Sprint	Ciclo curto com meta e capacidade	<i>Sprint 1: 2 semanas</i>
Critério de aceite	Como saberemos que está pronto	<i>Piloto com 50 pedidos sem erro</i>



Da EAP ao Backlog

Você já conhece essa estrutura: é a decomposição do escopo do PMBOK

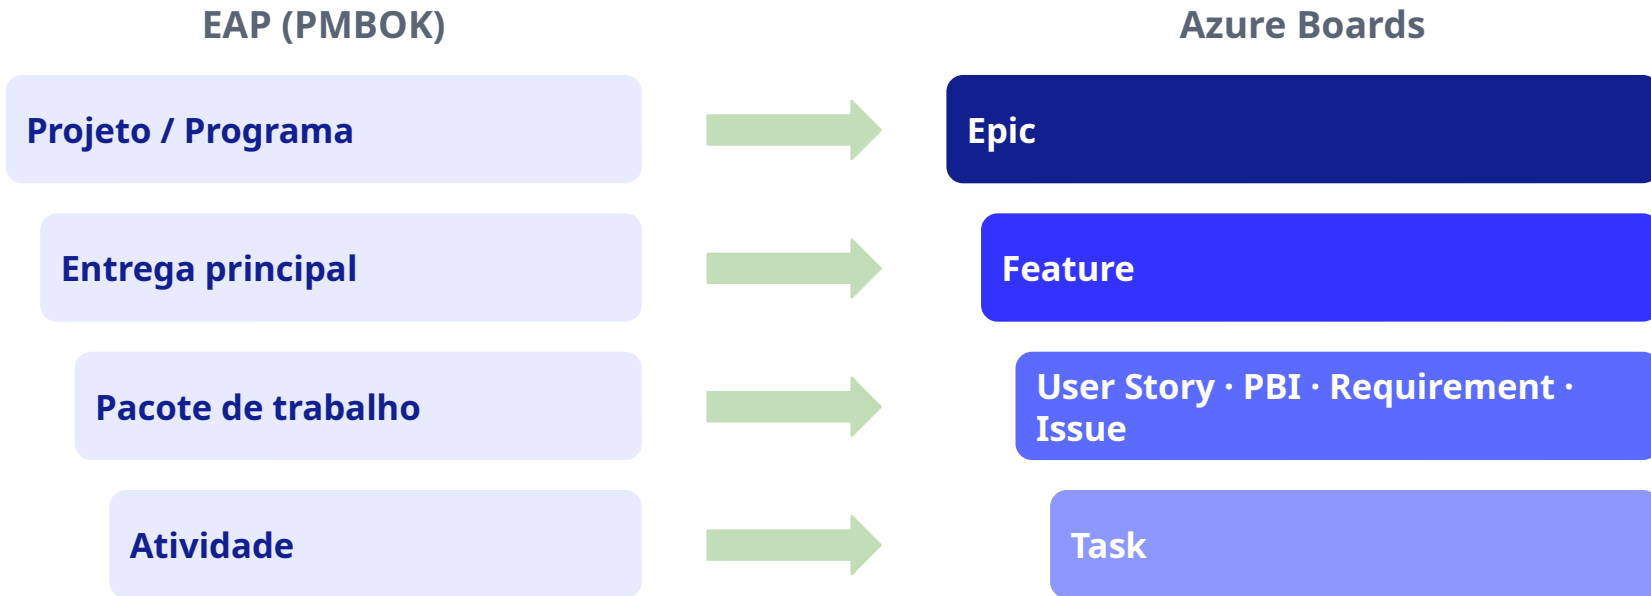

Diferença-chave: no Boards a EAP vira viva, com responsável, estimativa, estado e histórico em cada item.



Os 4 processos do Azure DevOps

O processo é escolhido ao criar o projeto e define a hierarquia dos itens

Basic

Epic

Issue

Task

Simple e direto. Poucos estados: To Do, Doing, Done.

Agile

Epic

Feature

User Story

Task

Flexível, orientado a produto. Estimativa em Story Points.

Scrum

Epic

Feature

PBI

Task

Estruturado em Sprints. Estimativa em Effort; foco em burndown.

CMMI

Epic

Feature

Requirement

Task

Formal, voltado a governança e auditoria.

+ Change Request, Risk, Review e Issue relacionados ao Requirement



Mesmo raciocínio, vocabulário diferente

Exemplos de decomposição em cada processo

Processo	Exemplo de decomposição	Quando usar
Basic	Epic: Implantar Portal do Cliente → Issue: Tela de login → Task: Criar formulário de autenticação	Times pequenos, fluxo operacional, projetos simples
Agile	Epic: Sistema de Delivery → Feature: Gestão de pedidos → User Story: Como cliente, quero acompanhar meu pedido → Task: Criar tela de rastreamento	Produtos digitais, entregas iterativas, pouca formalidade
Scrum	Epic: App bancário → Feature: Transferência PIX → PBI: Permitir transferência instantânea → Task: Validar chave PIX	Times com Sprints bem definidas e cerimônias
CMMI	Epic: Sistema governamental → Feature: Governança de acessos → Requirement: Controle de acesso por perfil → Task: Atualizar regras de permissão (+ Change Request: alterar política de autenticação)	Governança, compliance, auditoria e aprovações formais



Quem utiliza?

Empresas de diversos setores, em ambientes que exigem:



Rastreabilidade



Colaboração



Governança



Agilidade



Tecnologia · Financeiro · Indústria · Governo e Saúde



Métricas que apoiam a gestão do projeto

Burndown

Trabalho restante na Sprint

Velocity

Capacidade de entrega por Sprint

Lead Time

Do pedido à entrega

Cycle Time

Do início da execução à entrega

Throughput

Quantidade entregue no período

CFD


Onde o fluxo trava (gargalos)

Mais importante do que ver gráficos é interpretar o comportamento do time.



Interpretando métricas: o burndown

Exemplo ilustrativo: Sprint de 10 dias, 80 horas planejadas

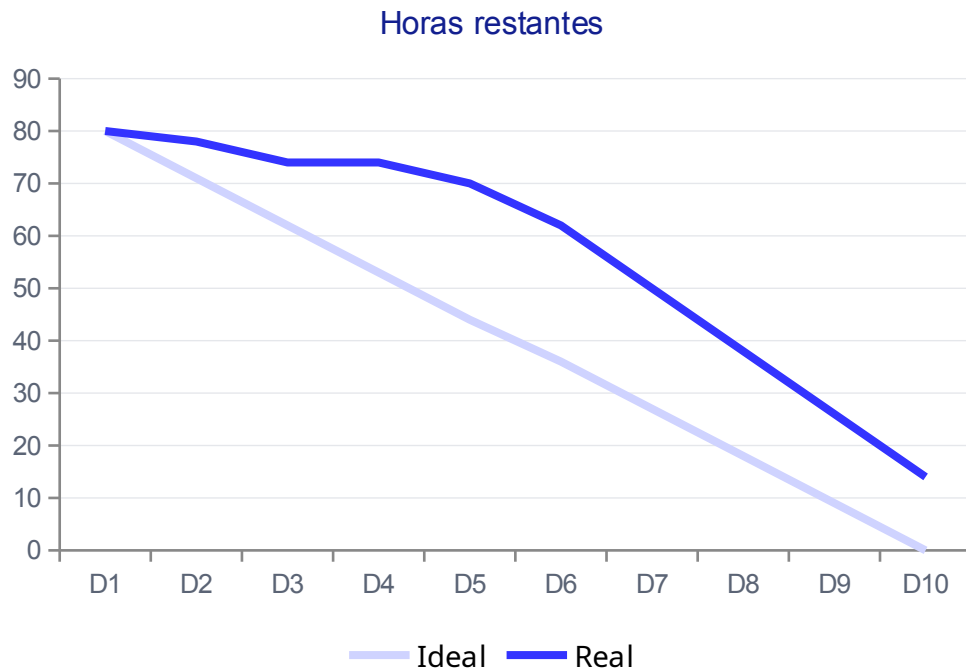

O que o gestor lê aqui

Linha real acima da ideal: atraso

Linha reta por dias (D3-D4):
impedimento

Linha subindo: escopo entrou na Sprint

Sobrou trabalho em D10: capacidade superestimada

Velocity é a média entregue por Sprint:
base para previsibilidade e
planejamento das próximas.

Gestão visual e acompanhamento em tempo real



Dashboards permitem:

- Acompanhar o progresso
- Identificar gargalos
- Visualizar a produtividade
- Monitorar bugs e riscos
- Acompanhar Sprints
- Apoiar a tomada de decisão




Métricas ajudam o gestor a decidir antes de o problema acontecer.

Posição de mercado

A Microsoft (Azure DevOps / Azure Boards) é avaliada pelo Gartner na categoria Enterprise Agile Planning Tools: ferramentas que permitem escalar práticas ágeis de forma integrada na organização.

O que é o Gartner?

Referência global em análise de tecnologia; seus relatórios orientam decisões de grandes organizações.

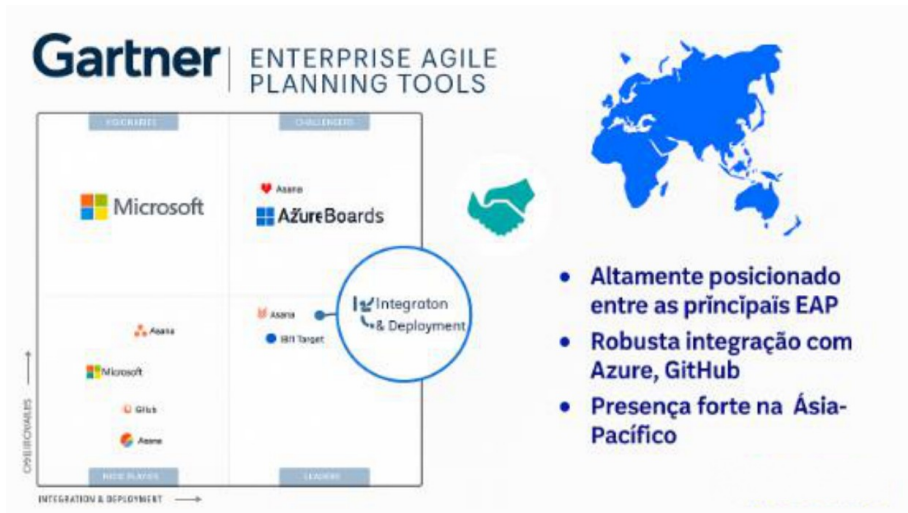

[gartner.com/reviews/market/enterprise-agile-planning-tools](https://www.gartner.com/public/gh/gartner/magicsquare/2020/enterprise-agile-planning-tools)



Vantagens para a gestão de projetos



Visão completa

de backlog, progresso e entregas



Colaboração

entre áreas técnicas e de negócio



Flexível

Basic, Agile, Scrum ou CMMI



Aderente

a projetos técnicos e não técnicos



Decisão com dados

dashboards, indicadores e histórico

Demonstração ao vivo

- 1 Criar um Epic e decompor em Feature → User Story → Task
- 2 Preencher responsável, estimativa, prioridade e critério de aceite
- 3 Mover um card no Board (Kanban)
- 4 Planejar a Sprint e a capacidade do time
- 5 Ver o dashboard e o burndown



Como vamos acessar hoje

Contas, equipes e projetos já foram preparados pelo professor



1. Acesse

`dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026`



2. Login

`nome.sobrenome@arijrt
technology.com.br` e a
senha da planilha
(troque no 1º acesso).



3. Projeto

Abra o projeto da sua
equipe (ex.: 03-scrum-
banking).



4. Confirme

Menu Boards visível?
Então está pronto!




Para depois da aula: o programa Azure for Students (azure.microsoft.com/free/students) dá US\$ 100 em créditos por 12 meses, sem cartão de crédito, validando com o e-mail institucional.



Como a turma está organizada

1 organização · 4 projetos · 1 processo por projeto

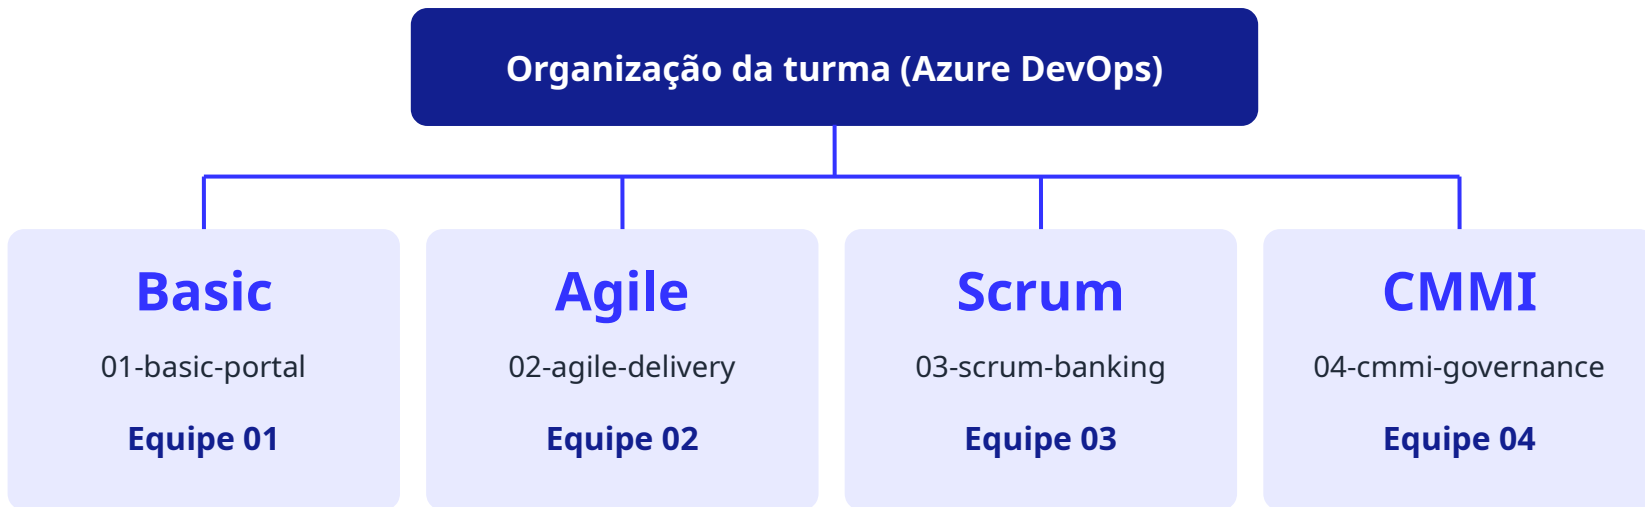

Todos com acesso Basic, no grupo Contributors do projeto da própria equipe. O professor acompanha os 4 projetos em tempo real.

Equipes



Equipe 01 · Basic

6 alunos

Composição enviada no grupo da turma

Equipe 02 · Agile

6 alunos

Composição enviada no grupo da turma

Equipe 03 · Scrum

6 alunos

Composição enviada no grupo da turma

Equipe 04 · CMMI

6 alunos

Composição enviada no grupo da turma



Os cenários de cada equipe

Código e pipelines já prontos: o foco é a gestão do projeto

Basic

Portal do Cliente

Cliente acompanha solicitações, status e comunicados

Mínimo: 1 Epic · 5 Issues · 10 Tasks

Agile

Sistema de Delivery

Pedidos, rastreamento e entrega

Mínimo: 1 Epic · 3 Features · 6 User Stories · 10 Tasks

Scrum

Aplicativo Bancário PIX

Transferência instantânea em Sprint

Mínimo: 1 Epic · 2 Features · 6 PBIs · 9 Tasks

CMMI

Sistema Governamental

Controle de acesso com auditoria

Mínimo: 1 Epic · 2 Features · 4 Requirements · 5 Change Requests · 9 Tasks

[Roteiro do aluno: docs/roteiro-hands-on.md no repositório da prática](#)



Roteiro da prática

1	Acessar o projeto	10'	Projeto da equipe, primeira pipeline e artefato
2	Campos e regras	15'	Descrição, prioridade, estimativa, critérios de aceite
3	Backlog realista	45'	Hierarquia completa seguindo o guia do processo
4	Refinar e priorizar	25'	MVP, risco, dependência, quebrar itens grandes
5	Board e sprint	25'	Itens em estados diferentes, um deles bloqueado
6	Pipeline	20'	Executar e registrar a evidência em um work item
7	Consultas e dashboard	30'	Shared Query + pelo menos 4 widgets

Pipeline: há 1 job gratuito para as 4 equipes, então o professor chama uma equipe por vez (Basic → Agile → Scrum → CMMI).



Apresentação (4 min por equipe)



Como o processo organiza o trabalho?
Mostrem a hierarquia.



Como a equipe priorizou e estimou?



Qual item é o maior risco ou dependência?



Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente?



O que a pipeline evidencia sobre a entrega?

Critérios de avaliação (0 a 2 cada)

Processo correto

Hierarquia coerente e relacionada

Campos: descrição, prioridade, estimativa, aceite

Priorização por valor, risco e dependência

Board / Sprint representa fluxo real

Pipeline executada e entendida

Dashboard que apoia decisão

Apresentação clara e objetiva

Por que cada processo organizou o trabalho de um jeito diferente?



Qual processo daria mais controle à diretoria? E mais agilidade ao time?




Onde entra a governança (PMBOK) e onde entra a adaptação (Scrum / Kanban)?



A ferramenta mudou o plano, ou só registrou as decisões de vocês?

A ferramenta é secundária: o que gera resultado são as decisões de planejamento e gestão.



Obrigado!

Arimatéia Júnior

Material de apoio: github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on

