

# Azure DevOps

Planejamento e gestão de projetos na prática

MBA em Gerenciamento de Projetos · 29/09/2026

# Arimatéia Júnior

## Formação

- Pós-graduado em Engenharia de Software com ênfase em DevOps – UNIFOR (2025)
- MBA em Arquitetura de Software e Soluções – XP Educação (2023)
- Especialização em Segurança da Informação – UNINASSAU (2021)
- Redes de Computadores – Faculdade Lourenço Filho (2014)

## Experiência profissional

- Arquiteto de Software e Soluções – TIVIT (cliente: Petrobras)
- Consultor de Tecnologia – ARI JR Technology



*Apaixonado por família, tecnologia e futebol*

Certificado em diversas tecnologias





# O que vamos fazer hoje

4 horas · teoria curta, prática longa · 29/09/2026



**45 min**

**Teoria + demo**

DevOps, Azure DevOps,  
processos e demonstração



**15 min**

**Acesso**

Convite, projeto da equipe e  
primeira pipeline



**2h40**

**Prática**

Backlog, sprint, pipeline e  
dashboard



**20 min**

**Apresentações**

4 min por equipe

*Objetivo: sair daqui sabendo transformar um objetivo de negócio em um plano rastreável, com escopo, prioridade, Sprint e acompanhamento.*



# Desafios da gestão tradicional de projetos

*Onde os projetos costumam perder o controle*



## Pouca visibilidade

sobre o andamento real do projeto



## Comunicação dispersa

e-mail, planilhas, conversas soltas



## Retrabalho

e perda de informações e decisões



## Entregas difíceis de acompanhar

quem faz o quê, e até quando?



## Sem rastreabilidade

nem histórico das mudanças



## Indicadores inconsistentes

para a tomada de decisão

**Ferramentas modernas surgiram justamente para atacar esses problemas e para integrar as áreas técnicas e de negócio.**



# O que é DevOps?

**DevOps é mais do que uma ferramenta ou metodologia:** é uma cultura que une Desenvolvimento (Dev) e Operações (Ops) para entregar valor de forma rápida, contínua e com qualidade, com o mínimo de atrito entre as equipes.

## DevOps não é apenas tecnologia.

É colaboração, automação, visibilidade e melhoria contínua.

## Principais benefícios



Integra times técnicos e não técnicos



Automatiza do planejamento à entrega



Reduz o tempo de entrega, com qualidade



Mais visibilidade e rastreabilidade



Processos em um único ecossistema



# Azure DevOps: uma plataforma, cinco serviços

*Do planejamento à entrega, tudo integrado e rastreável*



## Azure Boards

Planejamento:  
backlog, Kanban,  
sprints



## Azure Repos

Versionamento de  
código (Git)



## Azure Pipelines

Automação:  
integração e entrega  
contínua (CI/CD)



## Azure Test Plans

Testes manuais e  
automatizados



## Azure Artifacts

Pacotes (npm,  
NuGet, etc.)

### FOCO DE HOJE

*Os demais serviços aparecem só na demonstração: a gestão acontece no Boards.*



# Azure Boards: o que vamos usar hoje



## **Backlog**

Lista priorizada de tudo o que o projeto precisa entregar.



## **Board (Kanban)**

Quadro visual: A fazer → Fazendo → Feito.



## **Sprints**

Ciclos curtos (ex.: 2 semanas) com meta e capacidade.



## **Consultas (Queries)**

Filtros salvos: riscos abertos, itens atrasados...



## **Dashboards**

Painel com progresso, burndown e indicadores.



# Glossário rápido


*O vocabulário do Azure Boards traduzido para gestão de projetos*

| Termo                     | Significado                                 | Exemplo                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Epic</b>               | Grande objetivo ou iniciativa               | <i>Lançar o app de delivery</i>                  |
| <b>Feature</b>            | Entrega relevante que compõe o Epic         | <i>Programa de parceiros</i>                     |
| <b>User Story / PBI</b>   | Necessidade de um usuário, com valor        | <i>Como cliente, quero acompanhar meu pedido</i> |
| <b>Task</b>               | Atividade concreta, com responsável e horas | <i>Treinar equipe da loja 1 (4h)</i>             |
| <b>Backlog</b>            | Lista priorizada de itens                   | <i>Ordem = prioridade</i>                        |
| <b>Sprint</b>             | Ciclo curto com meta e capacidade           | <i>Sprint 1: 2 semanas</i>                       |
| <b>Critério de aceite</b> | Como saberemos que está pronto              | <i>Piloto com 50 pedidos sem erro</i>            |



# Da EAP ao Backlog

*Você já conhece essa estrutura: é a decomposição do escopo do PMBOK*

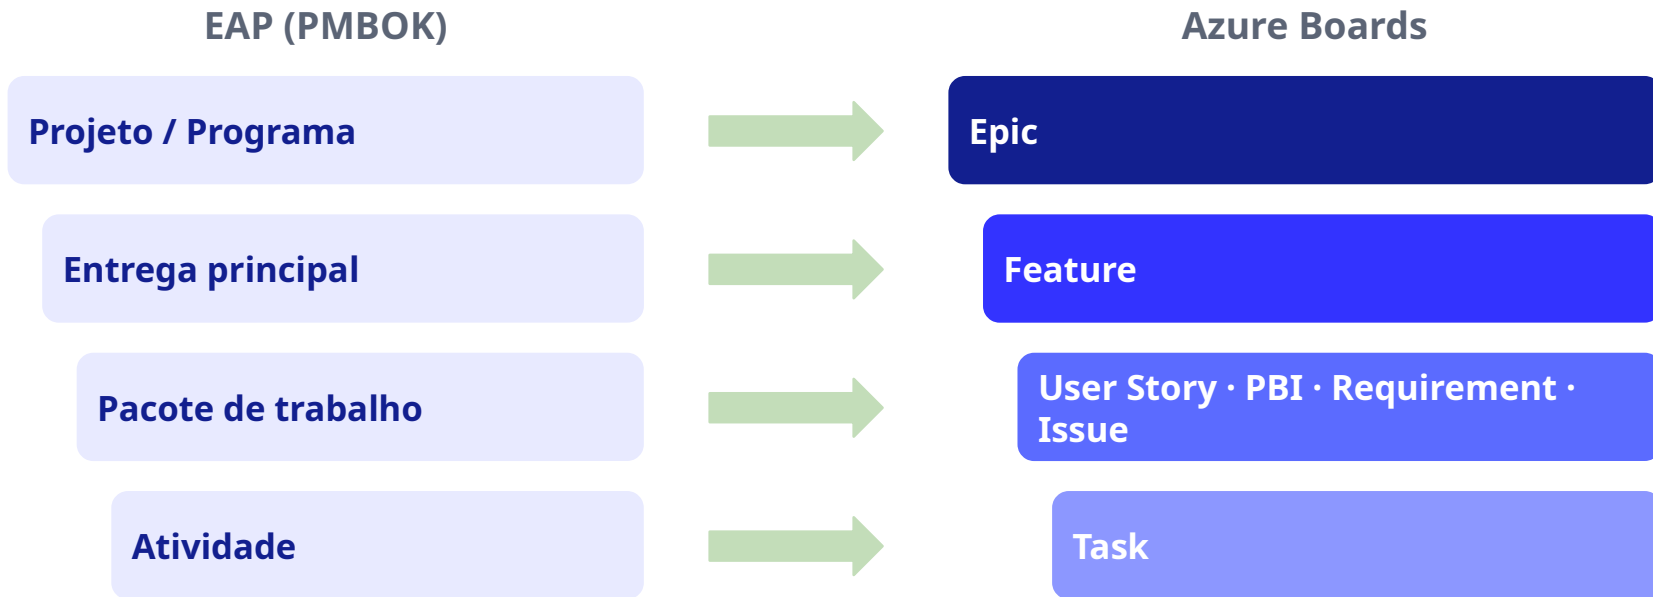

*Diferença-chave: no Boards a EAP vira viva, com responsável, estimativa, estado e histórico em cada item.*



# Os 4 processos do Azure DevOps

*O processo é escolhido ao criar o projeto e define a hierarquia dos itens*

## Basic

Epic

Issue

Task

Simple e direto. Poucos estados: To Do, Doing, Done.

## Agile

Epic

Feature

User Story

Task

Flexível, orientado a produto. Estimativa em Story Points.

## Scrum

Epic

Feature

PBI

Task

Estruturado em Sprints. Estimativa em Effort; foco em burndown.

## CMMI

Epic

Feature

Requirement

Task

Formal, voltado a governança e auditoria.

*+ Change Request, Risk, Review e Issue relacionados ao Requirement*



# Mesmo raciocínio, vocabulário diferente

*Exemplos de decomposição em cada processo*

| Processo     | Exemplo de decomposição                                                                                                                                                                              | Quando usar                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Basic</b> | Epic: Implantar Portal do Cliente → Issue: Tela de login → Task: Criar formulário de autenticação                                                                                                    | Times pequenos, fluxo operacional, projetos simples       |
| <b>Agile</b> | Epic: Sistema de Delivery → Feature: Gestão de pedidos → User Story: Como cliente, quero acompanhar meu pedido → Task: Criar tela de rastreamento                                                    | Produtos digitais, entregas iterativas, pouca formalidade |
| <b>Scrum</b> | Epic: App bancário → Feature: Transferência PIX → PBI: Permitir transferência instantânea → Task: Validar chave PIX                                                                                  | Times com Sprints bem definidas e cerimônias              |
| <b>CMMI</b>  | Epic: Sistema governamental → Feature: Governança de acessos → Requirement: Controle de acesso por perfil → Task: Atualizar regras de permissão (+ Change Request: alterar política de autenticação) | Governança, compliance, auditoria e aprovações formais    |

# Quem utiliza?

*Empresas de diversos setores, em ambientes que exigem:*



**Rastreabilidade**



**Colaboração**



**Governança**



**Agilidade**



Tecnologia · Financeiro · Indústria · Governo e Saúde





# Métricas que apoiam a gestão do projeto

## Burndown

Trabalho restante na Sprint

## Velocity

Capacidade de entrega por Sprint

## Lead Time

Do pedido à entrega

## Cycle Time

Do início da execução à entrega

## Throughput

Quantidade entregue no período

## CFD


Onde o fluxo trava (gargalos)

**Mais importante do que ver gráficos é interpretar o comportamento do time.**



# Interpretando métricas: o burndown

Exemplo ilustrativo: Sprint de 10 dias, 80 horas planejadas

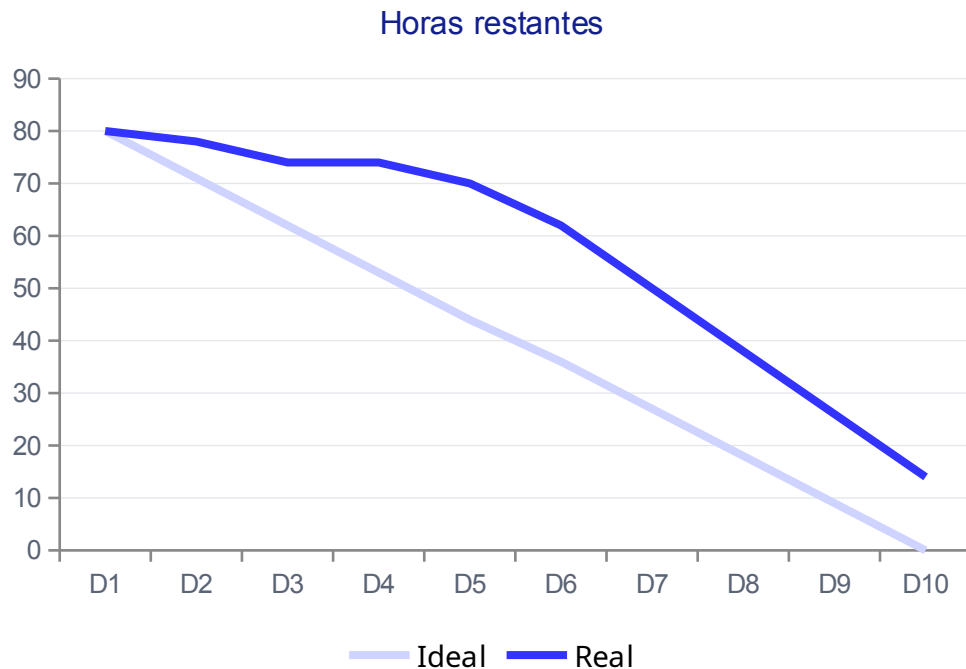

## O que o gestor lê aqui

**Linha real acima da ideal:** atraso

**Linha reta por dias (D3-D4):**  
impedimento

**Linha subindo:** escopo entrou na Sprint

**Sobrou trabalho em D10:** capacidade superestimada

**Velocity** é a média entregue por Sprint:  
base para previsibilidade e  
planejamento das próximas.

# Gestão visual e acompanhamento em tempo real



## Dashboards permitem:

- Acompanhar o progresso
- Identificar gargalos
- Visualizar a produtividade
- Monitorar bugs e riscos
- Acompanhar Sprints
- Apoiar a tomada de decisão




*Métricas ajudam o gestor a decidir antes de o problema acontecer.*

# Posição de mercado

A Microsoft (Azure DevOps / Azure Boards) é avaliada pelo Gartner na categoria Enterprise Agile Planning Tools: ferramentas que permitem escalar práticas ágeis de forma integrada na organização.

## O que é o Gartner?

Referência global em análise de tecnologia; seus relatórios orientam decisões de grandes organizações.

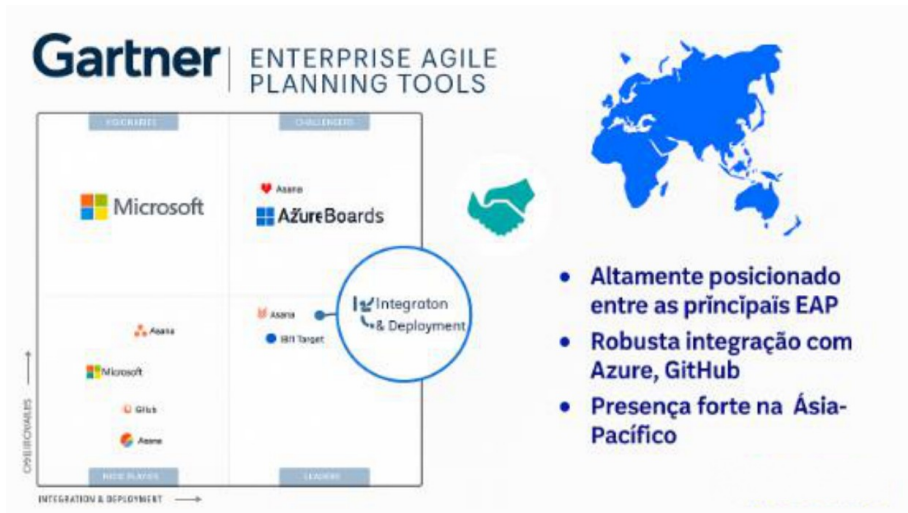

[gartner.com/reviews/market/enterprise-agile-planning-tools](https://gartner.com/reviews/market/enterprise-agile-planning-tools)



# Vantagens para a gestão de projetos



## Visão completa

de backlog, progresso e entregas



## Colaboração

entre áreas técnicas e de negócio



## Flexível

Basic, Agile, Scrum ou CMMI



## Aderente

a projetos técnicos e não técnicos



## Decisão com dados

dashboards, indicadores e histórico

# Demonstração ao vivo

- 1 Criar um Epic e decompor em Feature → User Story → Task
- 2 Preencher responsável, estimativa, prioridade e critério de aceite
- 3 Mover um card no Board (Kanban)
- 4 Planejar a Sprint e a capacidade do time
- 5 Ver o dashboard e o burndown



# Como vamos acessar hoje

*Nada de criar conta ou organização: o professor já preparou tudo*



## 1. Convite

Abra o e-mail "You've been invited to Azure DevOps" e clique em Join now.



## 2. Login

Entre com o mesmo e-mail que recebeu o convite.



## 3. Projeto

Abra o projeto da sua equipe (ex.: 03-scrum-banking).



## 4. Confirme

Menu Boards visível?  
Então está pronto!




**Para depois da aula:** o programa Azure for Students ([azure.microsoft.com/free/students](https://azure.microsoft.com/free/students)) dá US\$ 100 em créditos por 12 meses, sem cartão de crédito, validando com o e-mail institucional.



# Como a turma está organizada

*1 organização · 4 projetos · 1 processo por projeto*

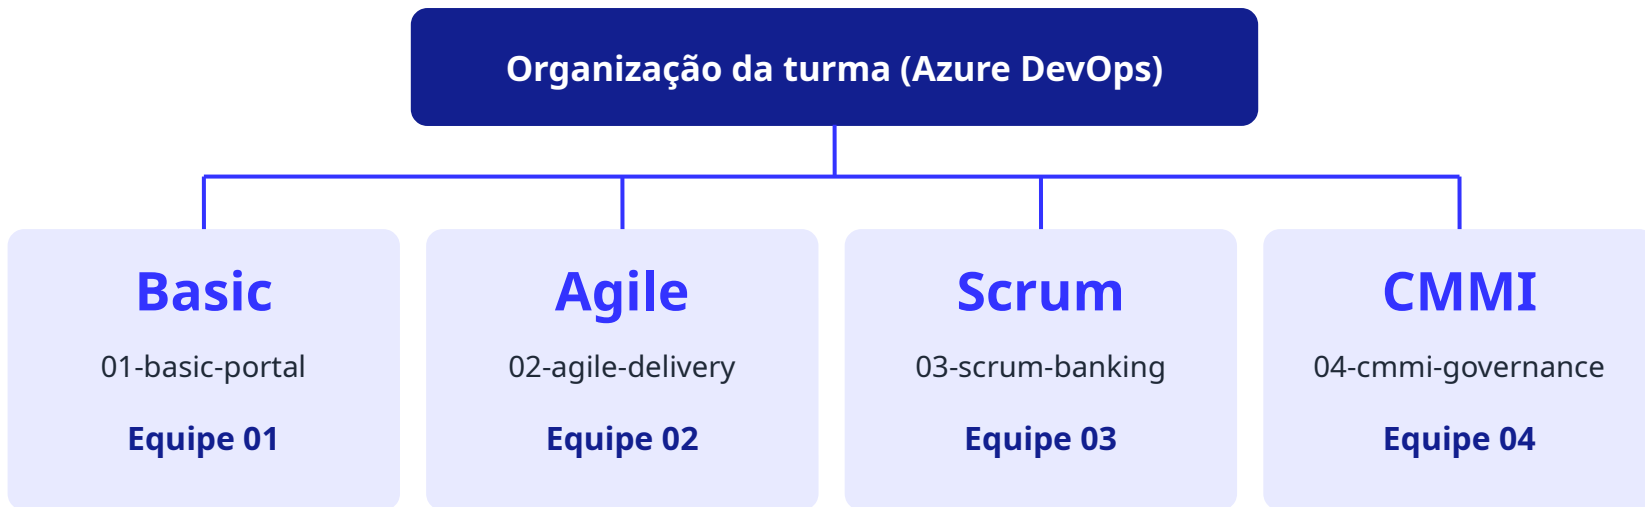

*Todos com acesso Basic, no grupo Contributors do projeto da própria equipe. O professor acompanha os 4 projetos em tempo real.*

# Equipes



## Equipe 01 · Basic

6 alunos

Composição informada  
pelo professor em sala

## Equipe 02 · Agile

6 alunos

Composição informada  
pelo professor em sala

## Equipe 03 · Scrum

6 alunos

Composição informada  
pelo professor em sala

## Equipe 04 · CMMI

6 alunos

Composição informada  
pelo professor em sala



# Os cenários de cada equipe

*Código e pipelines já prontos: o foco é a gestão do projeto*

## Basic

### Portal do Cliente

Cliente acompanha solicitações, status e comunicados

*Mínimo: 1 Epic · 5 Issues · 10 Tasks*

## Agile

### Sistema de Delivery

Pedidos, rastreamento e entrega

*Mínimo: 1 Epic · 3 Features · 6 User Stories · 10 Tasks*

## Scrum

### Aplicativo Bancário PIX

Transferência instantânea em Sprint

*Mínimo: 1 Epic · 2 Features · 6 PBIs · 9 Tasks*

## CMMI

### Sistema Governamental

Controle de acesso com auditoria

*Mínimo: 1 Epic · 2 Features · 4 Requirements · 5 Change Requests · 9 Tasks*

[Roteiro do aluno: docs/roteiro-hands-on.md no repositório da prática](#)



# Roteiro da prática

|   |                              |     |                                                        |
|---|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Acessar o projeto</b>     | 10' | Projeto da equipe, primeira pipeline e artefato        |
| 2 | <b>Campos e regras</b>       | 15' | Descrição, prioridade, estimativa, critérios de aceite |
| 3 | <b>Backlog realista</b>      | 45' | Hierarquia completa seguindo o guia do processo        |
| 4 | <b>Refinar e priorizar</b>   | 25' | MVP, risco, dependência, quebrar itens grandes         |
| 5 | <b>Board e sprint</b>        | 25' | Itens em estados diferentes, um deles bloqueado        |
| 6 | <b>Pipeline</b>              | 20' | Executar e registrar a evidência em um work item       |
| 7 | <b>Consultas e dashboard</b> | 30' | Shared Query + pelo menos 4 widgets                    |

*Pipeline: há 1 job gratuito para as 4 equipes, então o professor chama uma equipe por vez (Basic → Agile → Scrum → CMMI).*



# Apresentação (4 min por equipe)



Como o processo organiza o trabalho?  
Mostrem a hierarquia.



Como a equipe priorizou e estimou?



Qual item é o maior risco ou dependência?



Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente?



O que a pipeline evidencia sobre a entrega?

## Critérios de avaliação (0 a 2 cada)

Processo correto

Hierarquia coerente e relacionada

Campos: descrição, prioridade, estimativa, aceite

Priorização por valor, risco e dependência

Board / Sprint representa fluxo real

Pipeline executada e entendida

Dashboard que apoia decisão

Apresentação clara e objetiva

# Por que cada processo organizou o trabalho de um jeito diferente?



Qual processo daria mais controle à diretoria? E mais agilidade ao time?



Onde entra a governança (PMBOK) e onde entra a adaptação (Scrum / Kanban)?



A ferramenta mudou o plano, ou só registrou as decisões de vocês?

*A ferramenta é secundária: o que gera resultado são as decisões de planejamento e gestão.*



# Obrigado!

Arimatéia Júnior

Material de apoio: [github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on](https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on)

